


Vollsperrung BA 1 + BA 2
Fräsarbeiten: 09.04. + 10.04.2019
 (Schranken öffnen z. Feierabend 10.04.)
Deckeneinbau: 15.04. - 18.04.2019
 (Schranken öffnen z. Feierabend 18.04.)

Montag, 15.04.19:
Erneuerung des Unterbaus
 (falls erforderlich erfolgt Deckeneinbau zu späterem Zeitpunkt)

Dienstag, 16.04.19:
Anspritzen im südl. Abschnitt bis „Berliner Str.“, anschl. Deckeneinbau
 (Abschnitt bleibt geschlossen bis 17.04.19 früh)
Mittwoch, 17.04.19:
Anspritzen im nördl. Abschnitt ab „Berliner Str.“, anschl. Deckeneinbau
 (südl. Abschnitt ist dann wieder offen)
Donnerstag, 18.04.19:
Restarbeiten, zum Feierabend kpl. offen

Dienstag, 09.04.19:
Fräsarbeiten in 2 Abschnitten nacheinander,
Teilung Höhe „Berliner Str.“ !
 (Restarbeiten Fräsen unter Verkehr am Mittwoch, 10.04.19)

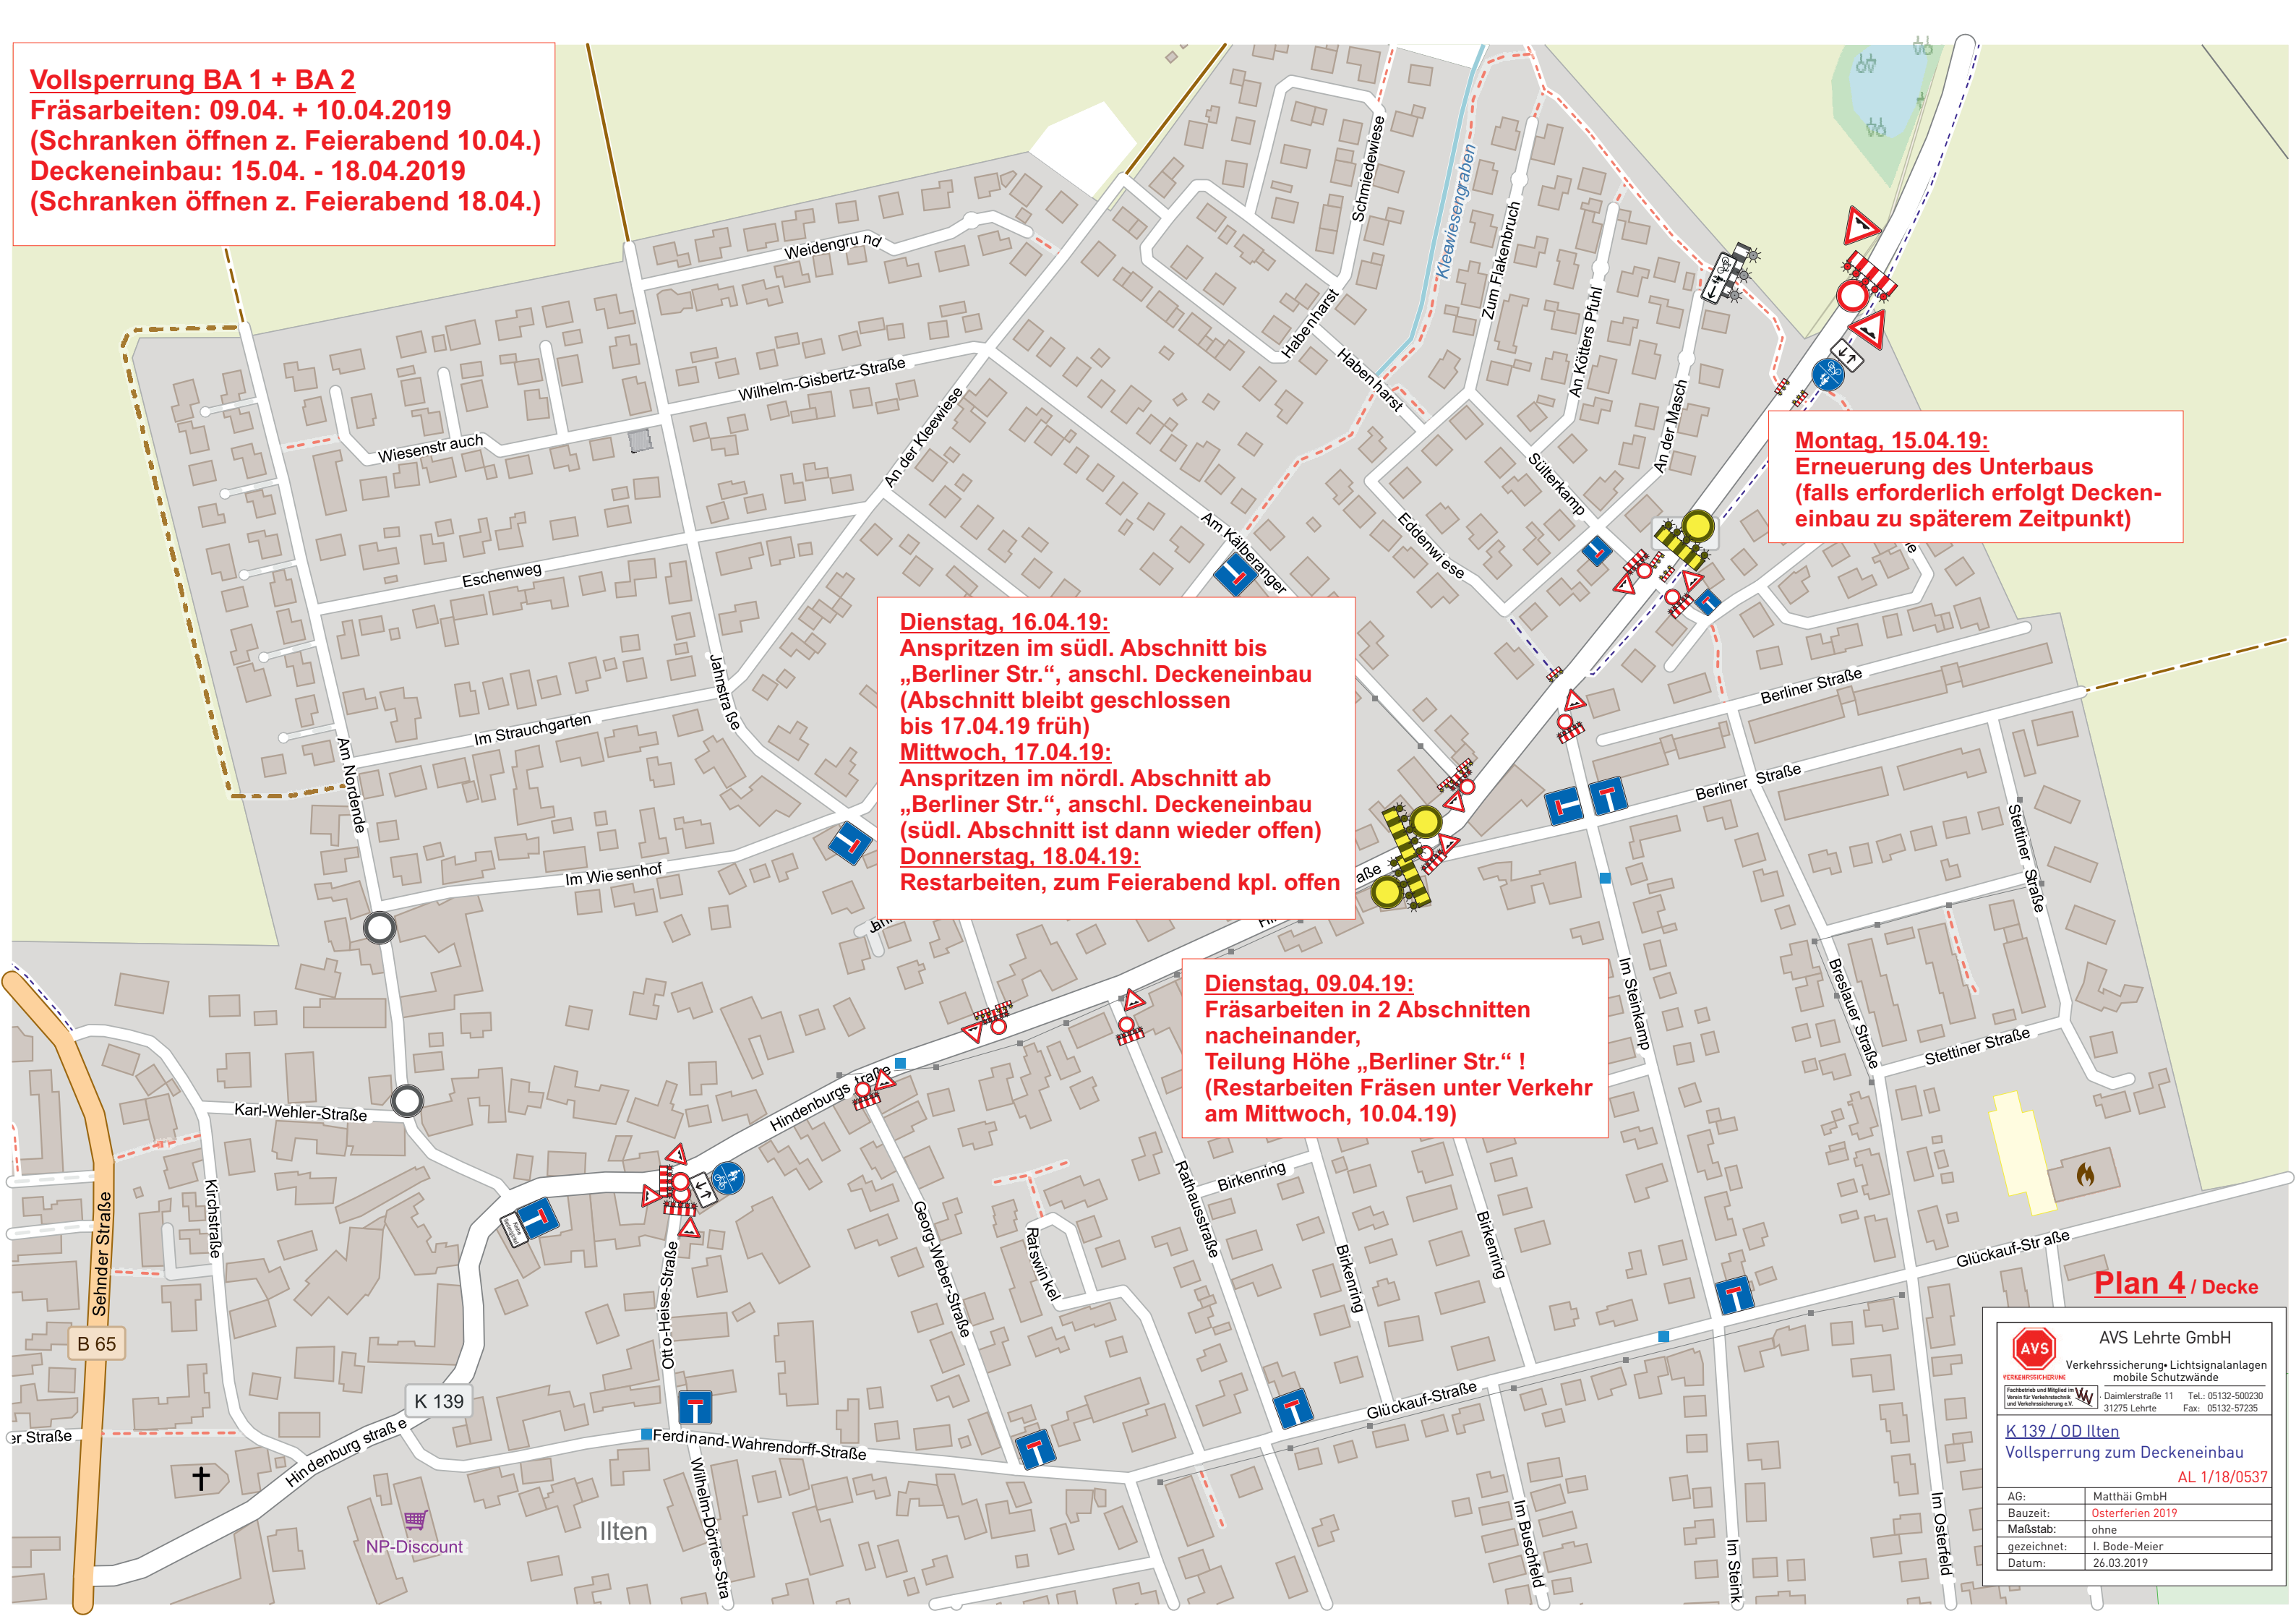

Plan 4 / Decke

AVS	
AVS Lehrte GmbH	
Verkehrssicherung • Lichtsignalanlagen mobile Schutzwände	
<small>Fachbetrieb und Mitglied im Verband für Verkehrszeichen und Verkehrsicherung e.V.</small>	
<small>Daimlerstraße 11 Tel.: 05132-500230 31275 Lehrte Fax: 05132-57235</small>	
K 139 / OD Ilten	
Vollsperrung zum Deckeneinbau	
AL 1/18/0537	
AG:	Matthäi GmbH
Bauzeit:	Osterferien 2019
Maßstab:	ohne
gezeichnet:	I. Bode-Meier
Datum:	26.03.2019
